

# Stackfield

Als strategisches Werkzeug des städtischen  
Projektmanagement (PJM).

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Städtische Ausgangslage.**
  - **Bedeutung für die Stadtverwaltung.**
  - **Chancen für die Stadtverwaltung.**
  - **Städtische Weiterentwicklung in 4 Phasen.**
  - **Die Software Stackfield.**

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- **Städtische Ausgangslage:**
  - Innerstädtisch historisch gewachsenes Projektmanagement.
  - Insellösungen, teilweise je Team / Abteilung / Bereich.
  - Begrenzte Methoden und Mittel.
  - Kopfwissen anstatt dokumentiertes Wissen.
  - Kein einheitliches Konzept.

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- **Bedeutung für die Stadtverwaltung :**
  - Geringere Projektmanagementeffektivität.
  - Verluste oder Unklarheiten bei Transparenz, Information, Kommunikation, Qualität, Ressourcen und Zeit.
  - Individuelle Qualitätsmerkmale mindern Auditierung und Optimierung.
  - Zielgerichtete Weiterentwicklung eines zentralen PJM unmöglich.

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- **Chancen für die Stadtverwaltung:**
  - Start auf grüner Wiese, keine bremsenden Strukturen.
  - Entwicklung bedarfsgerechtes PJM; Hybrid aus klassisch und agil.
  - Ableitung Anforderungen an „Theorie“(PJM) und „Praxis“(Software).
  - Veränderung herbeiführen!

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

2022 | 1. Phase „Entscheidung zur zielgerichteten gemeinsamen Projektarbeit“



2022 | 2. Phase „Ableitung Anforderungen und Entwicklung Umsetzungsmöglichkeiten“



2023 | 3. Phase „Konzeptionierung, Pilotierung und Beginn Schulungen“




2024 | 4. Phase „Verwaltungsweiter Rollout und Ausweitung Schulungen“

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- **Die Software Stackfield:**
  - Online Tool auch als App verfügbar, gehostet in DE.
  - Deutscher Hersteller, DSGVO-konform, unterliegt DE- sowie EU-Recht.
  - Basiert auf „Räumen“ und darin enthaltenen „Aufgaben“
  - Darstellung als KANBAN / Kacheln, Liste, Gantt-Diagramm.
  - Für Selbstorganisation sowie Teamarbeit geeignet.
  - Auf Projekt- und Tagesgeschäft flexibel anpassbar.
  - Unterstützt kontrollierte Zusammenarbeit mit extern.
  - Erfüllt alle erarbeiteten Anforderungen.
  - Bietet weitere Features und Vorteile.

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Übersicht „Meine Woche“

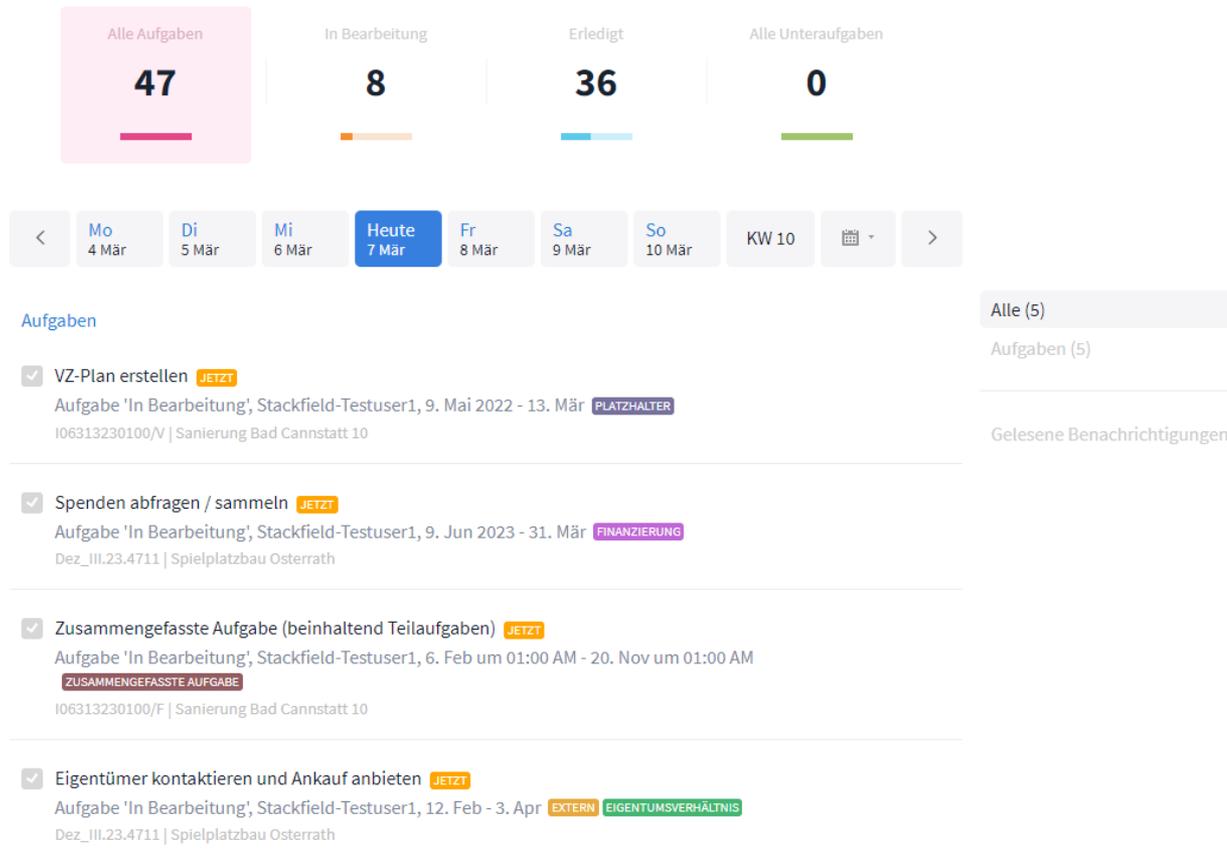

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Tagesgeschäft | KANBAN-Board

The screenshot displays a Kanban board interface for 'KANALBETRIEB' with the following columns and tasks:

- Aufgabensammlung(5)**
  - Erstellen Touren und Wartungszyklen - AVK Bösinghoven (27. Mai - 11. Aug)
  - Aktualisierung 97 im Wiki
  - Pflasterfläche 08 herstellen (3. Aug)
  - To Do Stromkrise (31. Dez)
  - Stunden prüfen (01. Apr - 08. Apr)
- ToDO (~14 Tage)(1)**
  - Erstellen Touren und Wartungszyklen - AVK Lank Latum (01. Mär - 31. Mai)
- In Bearbeitung(13)**
  - Sanierungskonzept erstellen - Bösinghoven - Ing.-Büro (12/14, 03. Jul 2023 - 29. Mär)
  - Sanierungskonzept erstellen - Rheingemeinden - Ing.-Büro (0/9, 04. Mär - 30. Sep)
  - R und I Übersicht erstellen (2/3)
  - Schlosserarbeiten im Kanalnetz (03. Apr 2023 - 31. Mai)
  - Kanalsanierung Büberich 6.BA - Ing.-Büro (4/5, 29. Feb - 31. Mär)
  - Digitalisierung FB 5 - Einscannen der Straßenakten (1/3, 29. Jun 2023 - 28. Jun)
- Erledigt(24)**
  - Erstellen Touren und Wartungszyklen - AVK Büberich (31. Dez 2023)
  - Erstellen Touren und Wartungszyklen - AVK Osterath (30. Okt 2023 - 29. Feb)
  - Dokumentation-Prüfung Gaswarmer (30. Nov 2023)
  - Errichtung Schwelle 30BA001 - Fa. Schmitz (6/6, 15. Sep 2023)

At the bottom left, the text '43 Aufgaben' is visible. The logo for 'STADT MEERBUSCH' is located in the bottom left corner of the overall image.

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug


- Tagesgeschäft | Liste

The screenshot displays the Stackfield interface for a task list. At the top, there is a search bar with 'Standard' selected, a 'Filter' button, and view options for 'Karten' and 'Liste' (which is active). The table has columns for 'TITEL', 'LABELS', 'STATUS', 'ZUGEWIESEN', 'FÄLLIG BIS', and 'MEHR'. The tasks are grouped into three sections: 'Aufgabensammlung (5)', 'ToDo (~14 Tage) (1)', and 'In Bearbeitung (13)'. Each task row includes a checkbox, a title, a label (e.g., 'Kanalbetrieb'), a status (e.g., 'Aufgabensammlung...', 'ToDo (~14 Tage)', 'In Bearbeitung'), a due date, and a 'MEHR' link.

TITEL	LABELS	STATUS	ZUGEWIESEN	FÄLLIG BIS	MEHR
<b>▼ Aufgabensammlung (5)</b>					
<input type="checkbox"/> Erstellen Touren und Wartungszyklen - AVK Bösinghoven	Kanalbetrieb	Aufgabensammlung...	D	27. Mai	
<input type="checkbox"/> Aktualisierung 97 im Wiki		Aufgabensammlung...	D		
<input type="checkbox"/> Pflasterfläche 08 herstellen		Aufgabensammlung...	D	31. Aug	
<input type="checkbox"/> To Do Stromkrise		Aufgabensammlung...	D	31. Dez	
<input type="checkbox"/> Stunden prüfen		Aufgabensammlung...	D	01. Apr	
Aufgabe hinzufügen...					
<b>▼ ToDo (~14 Tage) (1)</b>					
<input type="checkbox"/> Erstellen Touren und Wartungszyklen - AVK Lank Latum	Kanalbetrieb	ToDo (~14 Tage)	D	01. Mär	
Aufgabe hinzufügen...					
<b>▼ In Bearbeitung (13)</b>					
<input type="checkbox"/> Sanierungskonzept erstellen - Bösinghoven - Ing.-Büro		In Bearbeitung	D	03. Jul 2023	
<input type="checkbox"/> Sanierungskonzept erstellen - Rheingemeinden - Ing.-Büro	Kanalbetrieb	In Bearbeitung	D	04. Mär	
<input type="checkbox"/> R und I Übersicht erstellen		In Bearbeitung	D		
<input type="checkbox"/> Schlosserarbeiten im Kanalnetz		In Bearbeitung	D	03. Apr 2023	
<input type="checkbox"/> Kanalsanierung Büberich 6.BA - Ing.-Büro	Kanalbetrieb	In Bearbeitung	D	29. Feb	
<input type="checkbox"/> Digitalisierung FB 5 - Einscannen der Straßenakten		In Bearbeitung	D	29. Jun 2023	
43 Aufgaben					
Leere Bereiche anzeigen					

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Projektgeschäft | Projektübersicht

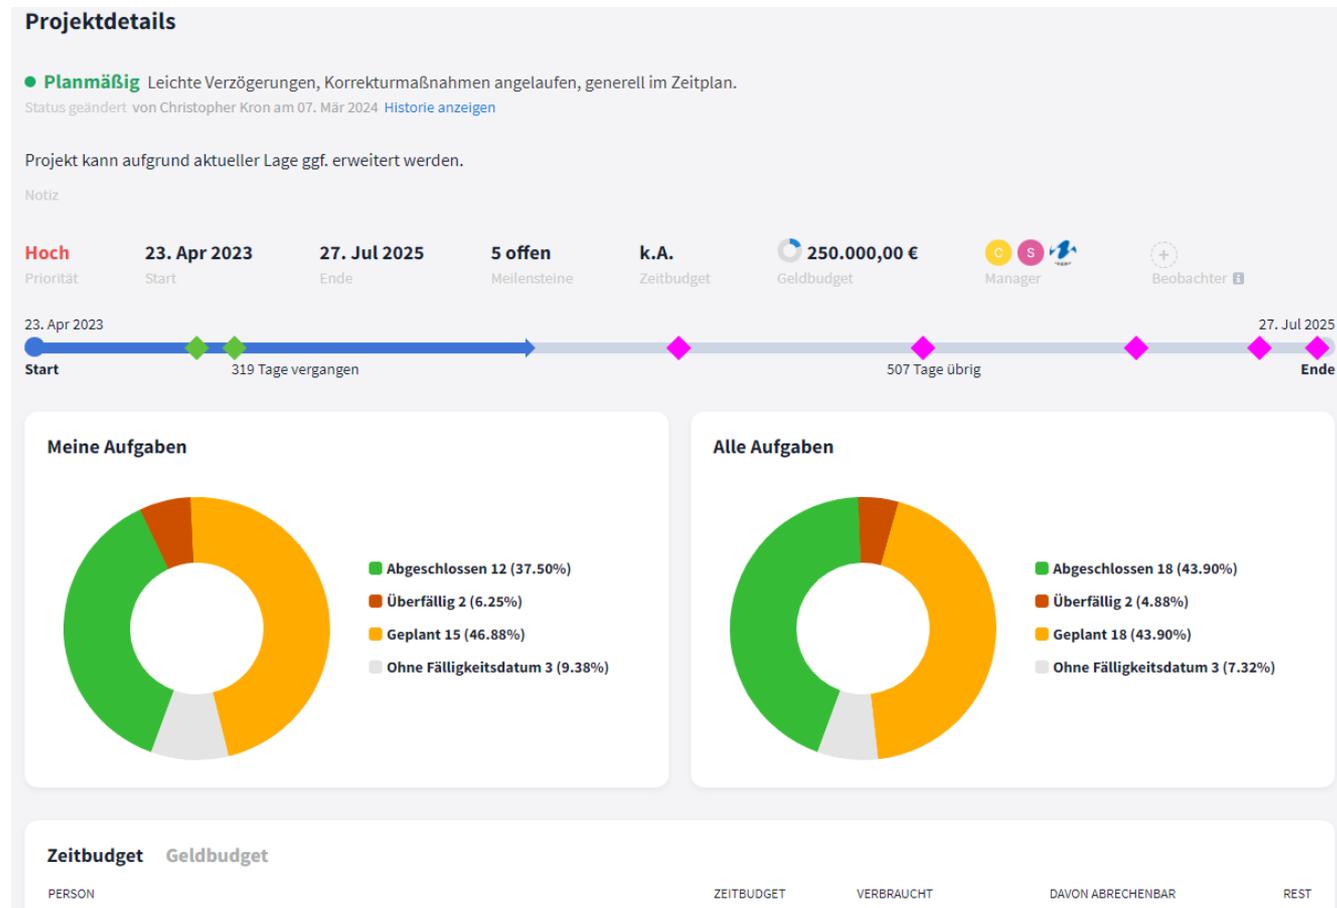

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Projektgeschäft | KANBAN

The screenshot displays a Kanban board in Stackfield with the following structure:

- Search:** Standard
- View:** Filter, Karten (selected), Liste
- Columns (Phases):**
  - Steuerungsphase(3):** 3 tasks, 2 visible (Neu(21)).
  - Initialisierungsphase(14):** 14 tasks, 1 visible (Aufgabe hinzufügen...).
  - Planungsphase(12):** 12 tasks, 6 visible:
    - BAU: Planentwurf Spielplatz erstellen (03. Jun - 05. Aug)
    - GERÄTE: Spielgeräte aussuchen (06. Aug - 18. Sep)
    - PFLANZEN: Pflanzen aussuchen (06. Aug - 11. Sep)
    - BÜRGERSCHAFT: Eröffnungsfeier planen (03. Jun - 28. Mai 2025)
    - EXTERN | EIGENTUMSVERHÄLTNIS: Eigentümer kontaktieren und Ankauf anbieten (12. Feb - 03. Apr)
    - EIGENTUMSVERHÄLTNIS: Kaufvertrag vorbereiten und durchführen (04. Apr - 31. Mai)
  - Bauphase(7):** 7 tasks, 6 visible:
    - BAU: Grube ausheben und mit Sand füllen (04. Nov - 20. Dez)
    - GERÄTE: Spielgeräte bestellen (19. Sep - 01. Nov)
    - PFLANZEN: Pflanzen bestellen (12. Sep - 24. Okt)
    - MEILENSTEIN | BAU: Baubeginn (04. Nov)
    - BAU | GERÄTE: Spielgeräte aufstellen (23. Dez - 03. Feb 2025)
    - BAU | PFLANZEN: Pflanzen einbetten (04. Feb 2025 - 17. Mär 2025)
    - MEILENSTEIN: Bau abgeschlossen
  - Abschluss(5):** 5 tasks, 4 visible:
    - PRÜFUNG: Interne Abnahme (18. Mär 2025 - 24. Apr 2025)
    - PRÜFUNG: externe Abnahme / TÜV (25. Apr 2025 - 03. Jun 2025)
    - BÜRGERSCHAFT: Eröffnungsfeier durchführen (04. Jun 2025 - 15. Jul 2025)
    - MEILENSTEIN | PRÜFUNG | BAU: Bau abgenommen (04. Jun 2025)
    - MEILENSTEIN | BAU: Projekt abgeschlossen (16. Jul 2025)
- Footer:** 41 Aufgaben

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Projektgeschäft | Liste


Standard ▼ Dez. III-23-4711 | Spielplatzbau Osterrath Filter Karten Liste +

TITEL	LABELS	STATUS	ZUGEWIESEN	FÄLLIG BIS	DRINGLICHKEIT	STICHWORT	PROJEKTPHASE	MEHR
<b>▼ Steuerungsphase (3)</b>								
<input type="checkbox"/> Projekt steuern	Extern	In Bearbeitung	S		Kritisch	Steuerung	Steuerungsphase	
<input type="checkbox"/> ...		Neu	S		Kritisch	Steuerung	Steuerungsphase	
<input type="checkbox"/> ...		Neu	S		Mittel	Steuerung	Steuerungsphase	
Aufgabe hinzufügen...								
<b>▼ Initialisierungsphase (14)</b>								
<input type="checkbox"/> Spenden abfragen / sammeln	Finanzierung	In Bearbeitung	S	09. Jun 2023	Mittel	Finanzierung	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitraum für Meinungsumfrage definieren	Meinungsumfrage	Erledigt	S	01. Mai 2023	Mittel	Meinungsumfrage	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Text für Meinungsumfrage entwerfen	Meinungsumfrage	Erledigt	S	08. Mai 2023	Blockierend	Meinungsumfrage	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Meinungsumfrage (online) stellen	Meinungsumfrage	Erledigt	S	24. Mai 2023	Mittel	Meinungsumfrage	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisse Meinungsumfrage sammeln und strukturieren	Meinungsumfrage	Erledigt	S	09. Jun 2023	Mittel	Meinungsumfrage	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitraum für Entwurfsvorschläge definieren	Entwurfsvorschlag	Erledigt	S S	01. Mai 2023	Blockierend	Entwurfsvorsch...	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Begleittext für Entwurfsvorschläge erstellen	Entwurfsvorschlag	Erledigt	S	08. Mai 2023	Mittel	Entwurfsvorsch...	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Plattform für Entwurfsvorschläge (online) stellen	Entwurfsvorschlag	Erledigt	S	19. Mai 2023	Mittel	Entwurfsvorsch...	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisse Meinungsumfrage auswerten	Meinungsumfrage	Erledigt	S	07. Jul 2023	Mittel	Meinungsumfrage	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisse Entwurfsvorschläge sammeln und strukturieren	Entwurfsvorschlag	Erledigt	S	30. Mai 2023	Mittel	Entwurfsvorsch...	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisse Entwurfsvorschläge auswerten	Entwurfsvorschlag	Erledigt	S	12. Jun 2023	Mittel	Meinungsumfrage	Initialisierung...	
<input checked="" type="checkbox"/> Meinungsumfrage erledigt	Meilenstein	Erledigt	S	04. Aug 2023	Mittel	Meinungsumfrage	Initialisierung...	

41 Aufgaben Leere Bereiche anzeigen


# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- **Projektgeschäft | Zeitplan / Gantt-Diagramm**

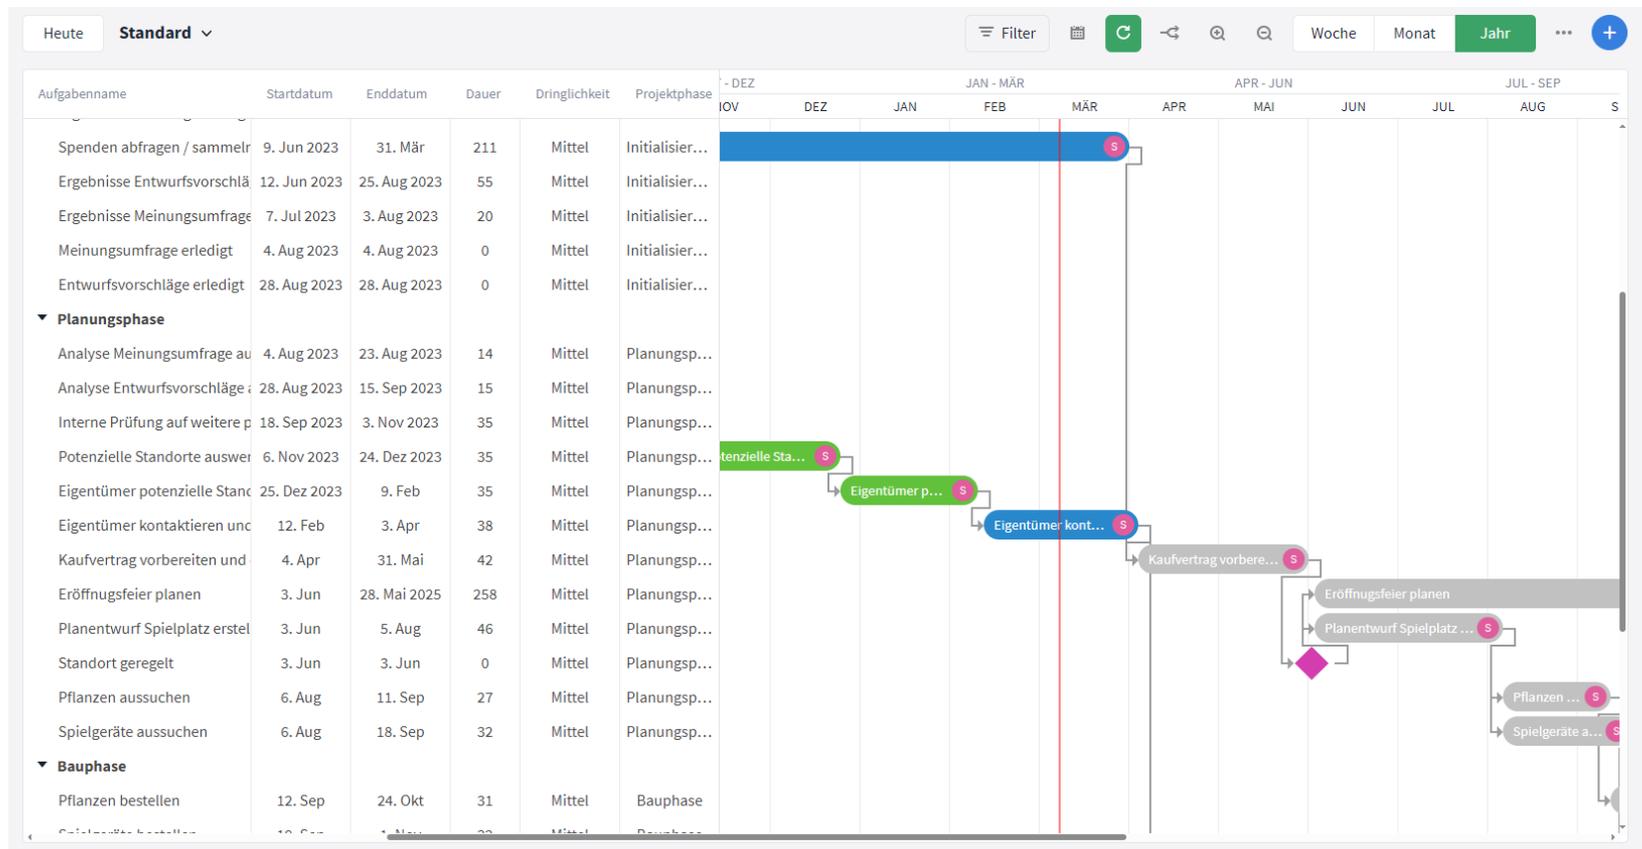

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Whiteboards

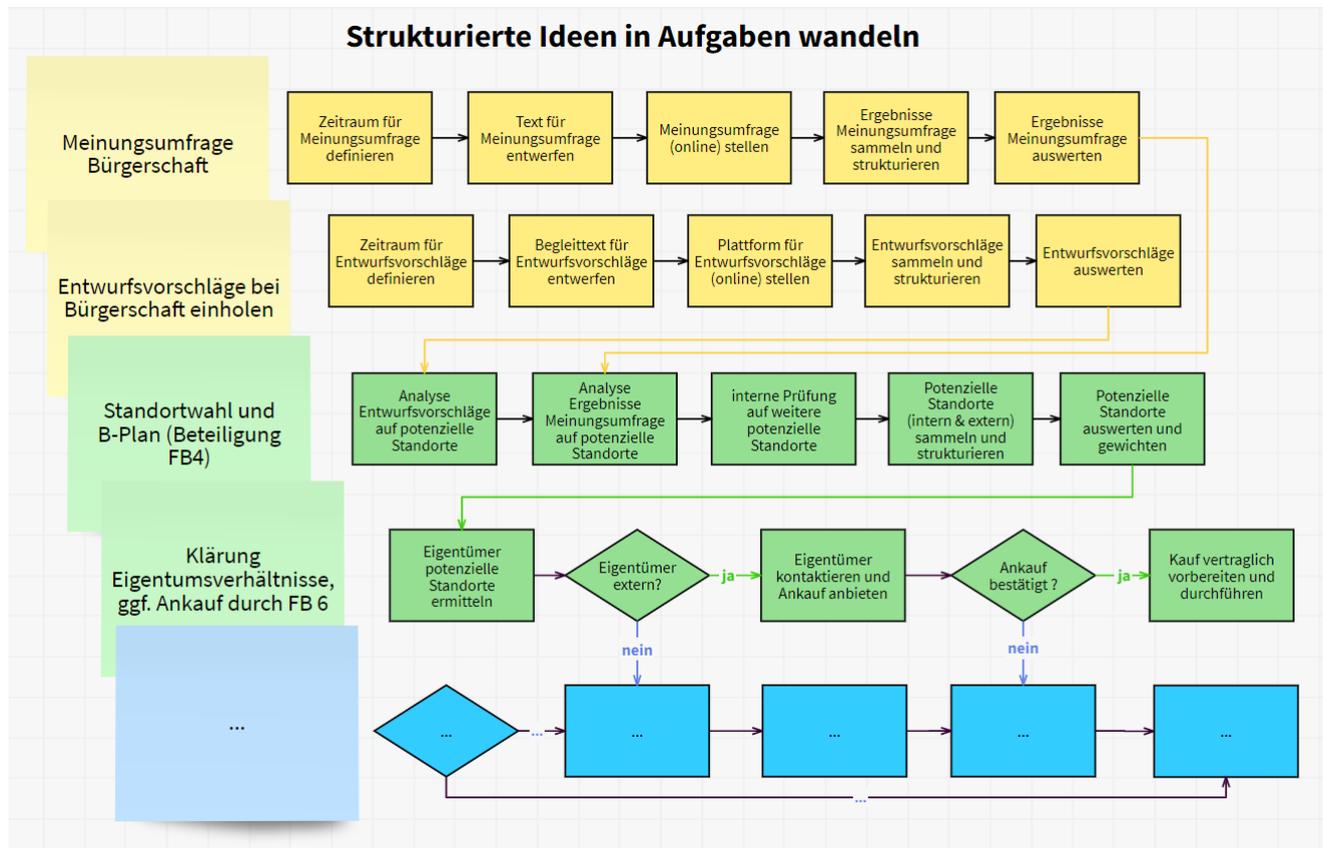

# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

- Kommunikation und Dokumentation

 **Laura** hat Version 2 der Seite erstellt.  
 Briefpapier\_Vorlage(2).docx  
105.08 KB, Vorschau · [Download](#) · [Version 2](#) Mär 06, 17:19

 **Dennis** hat diese Datei erstellt.  
image(5).png Mär 25, 19:23



 **Steffen**  
**all** Welche Farben wollen wir verwenden?

+ Schreibe etwas oder verwende @ um jemanden zu erwähnen Neue Zeile: S



# Stackfield als strategisches PJM-Werkzeug

